


Alle Kostenangaben in BRUTTO

1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11
KGr DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand	Schlussrechnung	Prognose (ohne Risiko)
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	452.237,33 €	406.176,83 €	564.895,74 €	374.082,09 €	938.977,83 €	1.034.739,75 €	1.034.739,75 €	1.034.739,75 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	23.501.626,28 €	23.211.462,23 €	17.414.451,31 €	4.395.324,39 €	21.809.775,71 €	20.118.215,35 €	8.669.590,93 €	22.378.658,22 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	4.883.421,46 €	6.627.471,13 €	6.325.017,86 €	549.482,92 €	6.874.500,78 €	6.924.678,83 €	44.920,43 €	8.179.190,63 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	1.056.637,78 €	891.192,68 €	859.636,17 €	0,00 €	859.636,17 €	920.442,43 €	0,00 €	1.020.442,43 €
600	23_600	Ausstattung	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	0,00 €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €	1.055.000,00 €
		Förderung	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.763.614,00 €	-1.763.614,00 €	-1.763.614,00 €
200-600		Gesamtkosten U+V	30.948.922,85 €	32.191.302,87 €	26.219.001,08 €	5.318.889,40 €	31.537.890,49 €	28.289.462,36 €	9.040.637,11 €	31.904.417,03 €
700	Anteil U+V	37% der KG 700 werden U+V zugeordnet	7.289.000,00 €	4.261.518,11 €	4.261.518,11 €	384.741,07 €	4.646.259,18 €	4.996.774,20 €	0,00 €	4.996.774,20 €
Summe			38.237.922,85 €	36.452.820,98 €	30.480.519,19 €	5.703.630,47 €	36.184.149,66 €	33.286.236,56 €	9.040.637,11 €	36.901.191,23 €
Risiko	Zuschlag 10%	3.823.792,28 €	42.061.715,13 €							
Index	Zuschlag 10%	4.206.171,51 €	46.267.886,65 €							
Summe		8.029.963,80 €	46.267.886,65 €							

Legende:


- R Campusrestaurant
- A Außerunterrichtlicher Bereich
- W Werken
- N Naturwissenschaften
- F Forum
- K Kreativ
- V Verwaltung
- U Unterricht
- T Theaterschatz
- TE Erweiterung Theaterschatz
- S Sporthalle
- SE Erweiterung Sporthalle
- B Boxclub

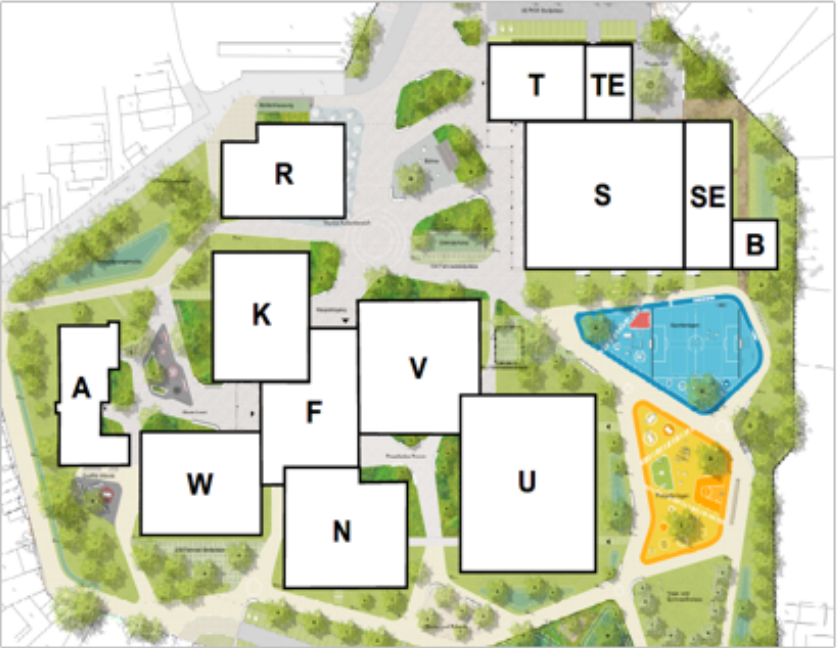

1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11
KGr DIN 276		Inhalte	Kostenberechnung vom 16.03.2022	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand Stand	Schlussrechnung	Prognose (ohne Risiko)
200	200	Herrichten und Erschließen	18.872,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.872,65 €
300	300	Bauwerk – Baukonstruktionen	14.864.146,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.864.146,97 €
400	400	Bauwerk – Technische Anlagen	6.615.060,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.615.060,82 €
500	500	Außenanlagen und Freiflächen	1.611.209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.611.209,00 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	1.556.326,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.556.326,79 €
200-600		Gesamtkosten F,K,N,W,A	24.665.616,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.665.616,23 €
700	Anteil K,N,F,W,A	31% der KG 700 werden K,N,F,W,A zugeordnet	5.928.868,97 €	2.462.552,26 €	3.466.316,71 €	312.948,19 €	3.779.264,90 €	4.064.373,65 €	0,00 €	5.928.868,97 €
Summe			30.594.485,20 €	2.462.552,26 €	3.466.316,71 €	312.948,19 €	3.779.264,90 €	4.064.373,65 €	0,00 €	30.594.485,20 €
Risiko	Zuschlag 10%	3.059.448,52 €	33.653.933,72 €							
Index	Zuschlag 10%	3.365.393,37 €	37.019.327,09 €							
Summe		6.424.841,89 €	37.019.327,09 €							

Legende:


- R Campusrestaurant
- A Außerunterrichtlicher Bereich
- W Werken
- N Naturwissenschaften
- F Forum
- K Kreativ
- V Verwaltung
- U Unterricht
- T Theaterschatz
- TE Erweiterung Theaterschatz
- S Sporthalle
- SE Erweiterung Sporthalle
- B Boxclub

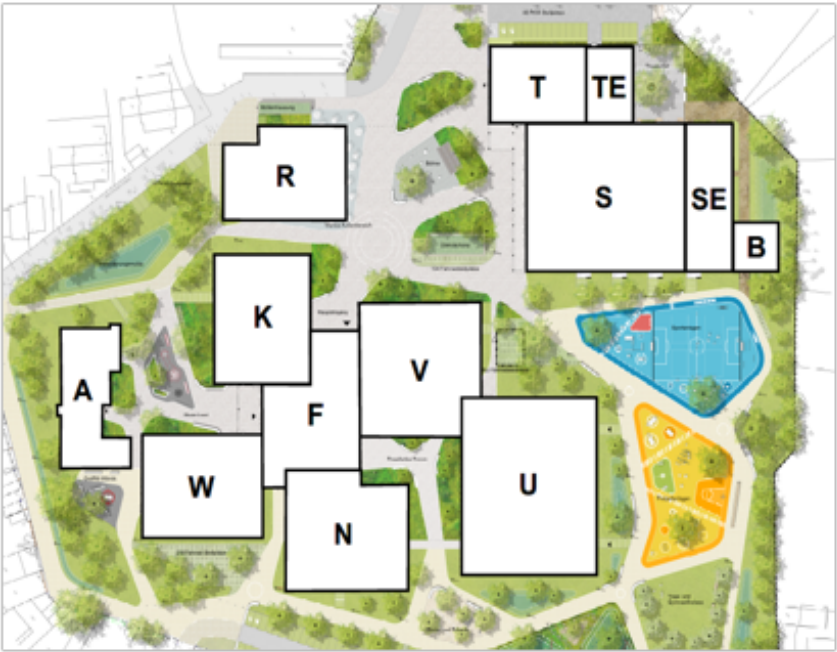

Alle Beträge brutto in Euro										
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11
KGr DIN 276	KTR Nummer	Inhalte	Kostenberechnung vom 16.03.2022	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand Stand	Schlussrechnung	Prognose (ohne Risiko)
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	87.211,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	2.771.650,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	2.083.624,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.083.624,16 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	198.362,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.362,50 €
200-600		Gesamtkosten R	5.140.848,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.140.848,71 €
700	Anteil R	6% der KG 700 werden R zugeordnet	1.235.704,72 €	513.249,23 €	722.455,49 €	65.225,18 €	787.680,67 €	847.103,51 €	0,00 €	1.235.704,72 €
Summe			6.376.553,43 €	513.249,23 €	722.455,49 €	65.225,18 €	787.680,67 €	847.103,51 €	0,00 €	6.376.553,43 €
Risiko	Zuschlag 10%	637.655,34 €	7.014.208,77 €							
Index	Zuschlag 10%	701.420,88 €	7.715.629,65 €							
Summe		1.339.076,22 €	7.715.629,65 €							

Legende:


- R Campusrestaurant
- A Außerunterrichtlicher Bereich
- W Werken
- N Naturwissenschaften
- F Forum
- K Kreativ
- V Verwaltung
- U Unterricht
- T Theaterschatz
- TE Erweiterung Theaterschatz
- S Sporthalle
- SE Erweiterung Sporthalle
- B Boxclub

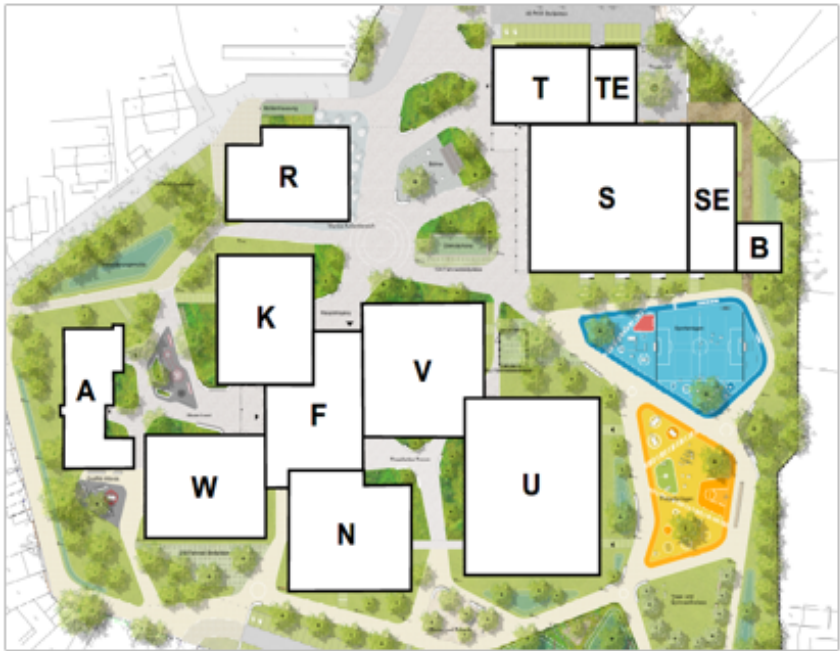

Alle Beträge brutto in Euro										
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11
KGr DIN 276	KTR Nummer	Inhalte	Kostenberechnung vom 16.03.2022	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand Stand	Schlussrechnung	Prognose (ohne Risiko)
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	329.927,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	9.010.918,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	4.989.955,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	304.501,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200-600		Gesamtkosten T,TE,S,SE	14.635.302,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.635.302,54 €
700	Anteil T,TE,S,SE	18% der KG 700 werden T,TE,S,SE zugeordnet	3.517.884,59 €	1.461.151,31 €	2.056.733,28 €	185.687,29 €	2.242.420,57 €	2.411.589,37 €	0,00 €	3.517.884,59 €
Summe			18.153.187,13 €	1.461.151,31 €	2.056.733,28 €	185.687,29 €	2.242.420,57 €	2.411.589,37 €	0,00 €	18.153.187,13 €
Risiko	Zuschlag 10%	1.815.318,71 €	19.968.505,84 €							
Index	Zuschlag 10%	1.996.850,58 €	21.965.356,42 €							
Summe		3.812.169,30 €	21.965.356,42 €							


Legende:

- R Campusrestaurant
A Außerunterrichtlicher Bereich
W Werken
N Naturwissenschaften
F Forum
K Kreativ
V Verwaltung
U Unterricht
T Theaterschatz
TE Erweiterung Theaterschatz
S Sporthalle
SE Erweiterung Sporthalle
B Boxclub

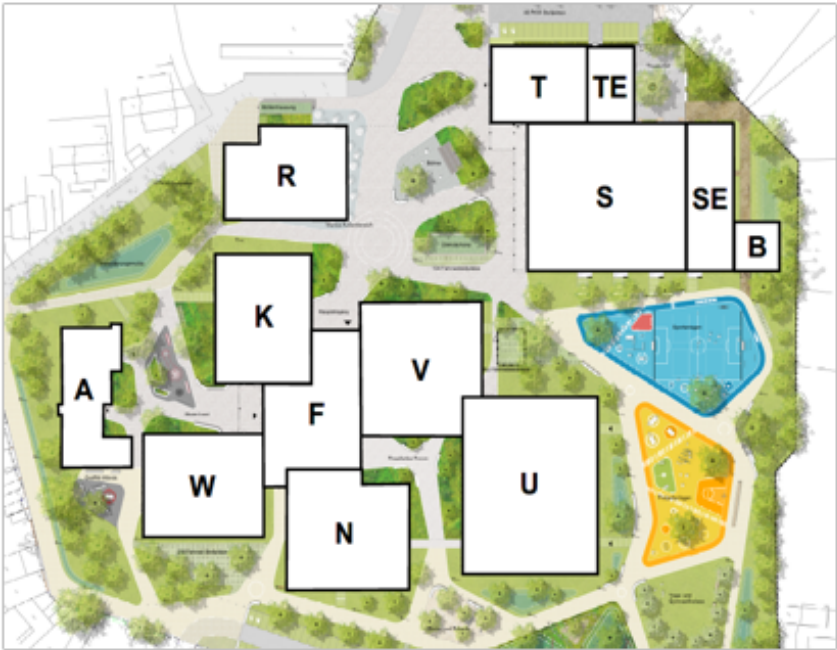

Alle Beträge brutto in Euro										
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11
KGr DIN 276	KTR Nummer	Inhalte	Kostenberechnung vom xx.xx.2026	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand Stand	Schlussrechnung	Prognose (ohne Risiko)
200	23_200	Vorbereitende Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	23_300	Bauwerk – Baukonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	23_400	Bauwerk – Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	23_500	Außenanlagen und Freiflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	23_600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200-600		Gesamtkosten B	760.423,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	760.423,12 €
700	Anteil B	1% der KG 700 werden B zugeordnet	182.782,75 €	75.918,71 €	106.864,04 €	9.647,97 €	116.512,01 €	125.301,70 €	0,00 €	182.782,75 €
Summe			943.205,87 €	75.918,71 €	106.864,04 €	9.647,97 €	116.512,01 €	125.301,70 €	0,00 €	943.205,87 €
Risiko	Zuschlag 10%	94.320,59 €	1.037.526,45 €							
Index	Zuschlag 10%	103.752,65 €	1.141.279,10 €							
Summe		198.073,23 €	1.141.279,10 €							

- Legende:
- R Campusrestaurant
 - A Außerunterrichtlicher Bereich
 - W Werken
 - N Naturwissenschaften
 - F Forum
 - K Kreativ
 - V Verwaltung
 - U Unterricht
 - T Theaterschatz
 - TE Erweiterung Theaterschatz
 - S Sporthalle
 - SE Erweiterung Sporthalle
 - B Boxclub

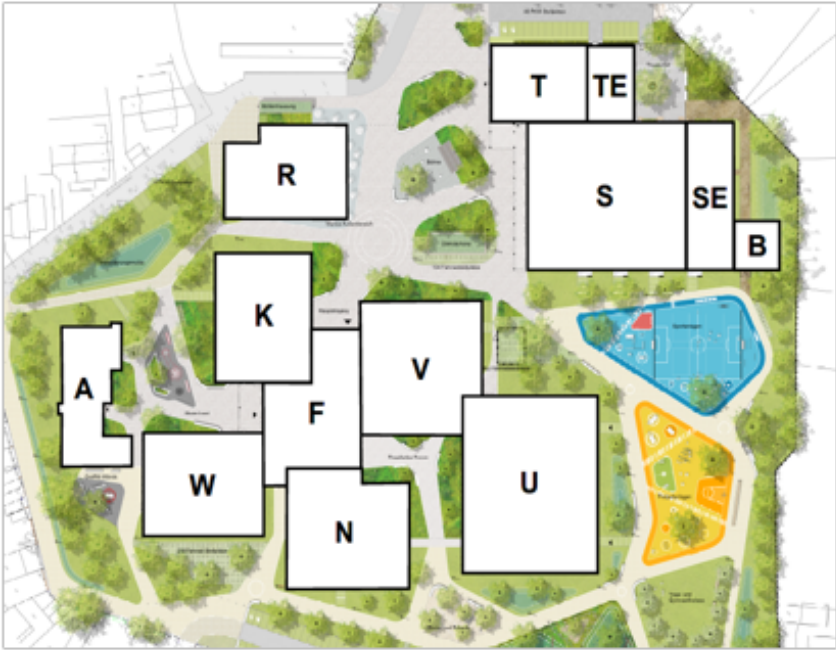

Projekt: BildungsCampus Siegburg
 Titel: Gesamtprojektkosten-Übersicht
 Stand 16.09.2026

Alle Kostenangaben in BRUTTO



1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10
KGr DIN 276	Vergabeeinheit	Inhalte	Kostenberechnung	bepreistes LV	Beauftragung	Nachtrag	Beauftragung (inkl. Nachtrag)	Zahlungsstand	Prognose (ohne Risiko)
200-600		U+V	30.948.922,85 €	32.191.302,87 €	26.219.001,08 €	5.318.889,40 €	31.537.890,49 €	28.289.462,36 €	31.904.417,03 €
200-600		Sanierung Schulgebäude (Bauteil F,K,N,W,A)	24.665.616,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.665.616,23 €
200-600		Neubau Campusrestaurant	5.140.848,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.140.848,71 €
200-600		Sanierung Bauteil S,T - Neubau SE,TE	14.635.302,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.635.302,54 €
200-600		Neubau Boxclub	760.423,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	760.423,12 €
500		Außenanlagen übergreifend (ohne U,V,F,K,N,W,A)	5.805.941,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.805.941,43 €
700	23_700	Baunebenkosten	19.700.000,00 €	11.517.616,51 €	11.517.616,51 €	1.039.840,73 €	12.557.457,24 €	13.504.795,13 €	19.700.000,00 €
Summen			101.657.054,88 €	43.708.919,38 €	37.736.617,59 €	6.358.730,13 €	44.095.347,72 €	42.502.871,49 €	102.612.549,06 €
		Gesamtkostenberechnung	101.657.054,88 €						
		Indexsteigerung und Risikoaufschlag	20.983.736,12 €						
		Zwischensumme	122.640.791,00 €						
		Erstattung Förderung EFRE+KfW	11.446.714,00 €						
		Gesamtsumme	111.194.077,00 €						

Legende:

R	Campusrestaurant
A	Außerunterrichtlicher Bereich
W	Werken
N	Naturwissenschaften
F	Forum
K	Kreativ
V	Verwaltung
U	Unterricht
T	Theaterschatz
TE	Erweiterung Theaterschatz
S	Sporthalle
SE	Erweiterung Sporthalle
B	Boxclub

