3004334 Erweiterung Kita Purzelbaum
Braschosser Str. 84
53721 Siegburg/Braschoß
Stand 10.01.2025_Kou

Bauterminplan Erweiterung Kita Purzelbaum- Stand 28.01.2025_Vorabzug

bft PLANUNG
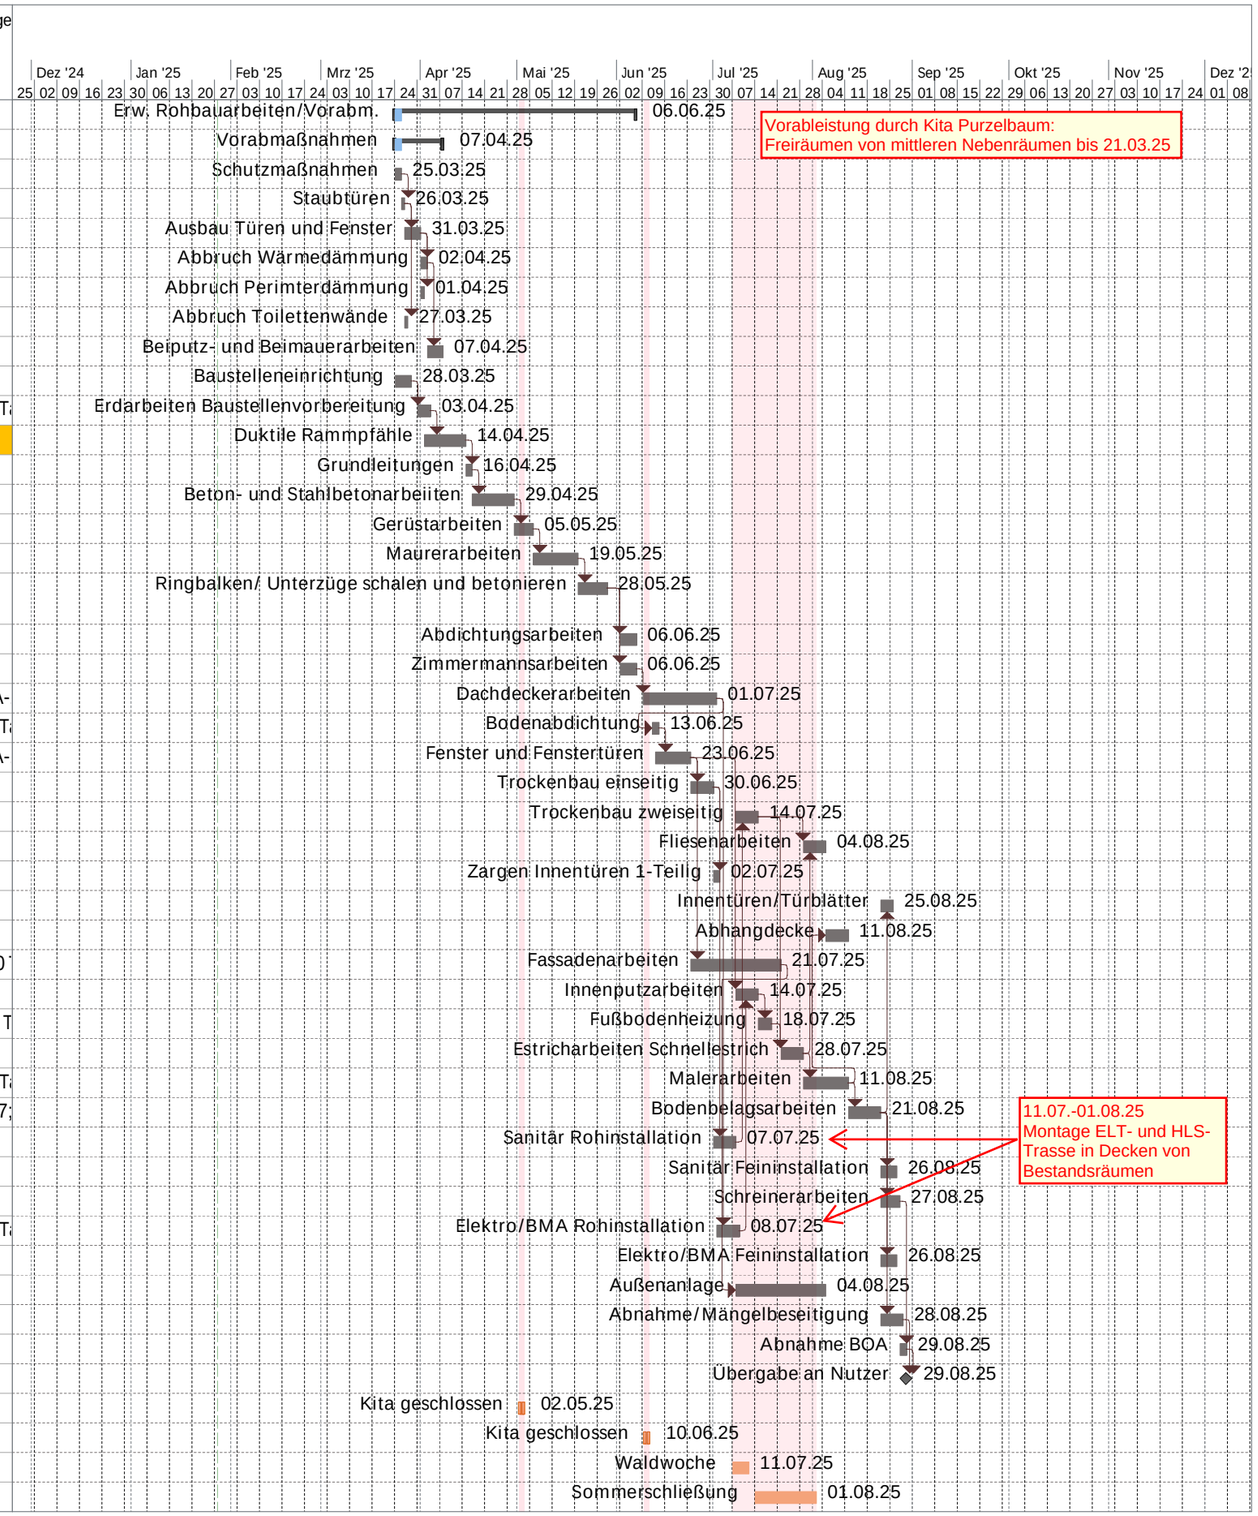
Nr.	Vor	Vorgangsname	Beteiligte	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolge
1		Erw. Rohbauarbeiten/Vorabm.		49 Tage	Mon 24.03.25	Fre 06.06.25		
2		Vorabmaßnahmen		11 Tage	Mon 24.03.25	Mon 07.04.25		
3		Schutzmaßnahmen		2 Tage	Mon 24.03.25	Die 25.03.25		4
4		Staubtüren		1 Tag	Mit 26.03.25	Mit 26.03.25	3	5;8
5		Ausbau Türen und Fenster		3 Tage	Don 27.03.25	Mon 31.03.25	4	6;7
6		Abbruch Wärmedämmung		2 Tage	Die 01.04.25	Mit 02.04.25	5	9
7		Abbruch Perimterdämmung		1 Tag	Die 01.04.25	Die 01.04.25	5	
8		Abbruch Toilettenwände		1 Tag	Don 27.03.25	Don 27.03.25	4	
9		Beiputz- und Beimauerarbeiten		3 Tage	Don 03.04.25	Mon 07.04.25	6	
10		Baustelleneinrichtung		5 Tage	Mon 24.03.25	Fre 28.03.25		11
11		Erdarbeiten Baustellenvorbereitung		4 Tage	Mon 31.03.25	Don 03.04.25	10	12EA-2 T
12		Duktile Rammpfähle		9 Tage	Mit 02.04.25	Mon 14.04.25	11EA-2 Tag	13
13		Grundleitungen		2 Tage	Die 15.04.25	Mit 16.04.25	12	14
14		Beton- und Stahlbetonarbeiiten		7 Tage	Don 17.04.25	Die 29.04.25	13	15
15		Gerüstarbeiten		2 Tage	Mit 30.04.25	Mon 05.05.25	14	16
16		Maurerarbeiten		10 Tage	Die 06.05.25	Mon 19.05.25	15	17
17		Ringbalken/ Unterzüge schalen und betonieren		7 Tage	Die 20.05.25	Mit 28.05.25	16	18;19
18		Abdichtungsarbeiten		5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	17	
19		Zimmermannsarbeiten		5 Tage	Mon 02.06.25	Fre 06.06.25	17	20
20		Dachdeckerarbeiten		15 Tage	Mon 09.06.25	Die 01.07.25	19	38;21EA-
21		Bodenabdichtung		2 Tage	Don 12.06.25	Fre 13.06.25	20EA-12 Ta	22EA-1 T
22		Fenster und Fenstertüren		5 Tage	Fre 13.06.25	Mon 23.06.25	21EA-1 Tag	29;30EA-
23		Trockenbau einseitig		5 Tage	Die 24.06.25	Mon 30.06.25	22	35;26
24		Trockenbau zweiseitig		5 Tage	Die 08.07.25	Mon 14.07.25	35	32;25
25		Fliesenarbeiten		5 Tage	Die 29.07.25	Mon 04.08.25	24;32	
26		Zargen Innentüren 1-Teilig		2 Tage	Die 01.07.25	Mit 02.07.25	23	
27		Innentüren/Türblätter		2 Tage	Fre 22.08.25	Mon 25.08.25	34	
28		Abhangdecke		5 Tage	Die 05.08.25	Mon 11.08.25	33EA-5 Tag	
29		Fassadenarbeiten		20 Tage	Die 24.06.25	Mon 21.07.25	22	40EA-10
30		Innenputzarbeiten		5 Tage	Die 08.07.25	Mon 14.07.25	38EA-1 Tag	31
31		Fußbodenheizung		4 Tage	Die 15.07.25	Fre 18.07.25	30	32EA+1 T
32		Estricharbeiten Schnellestrich		5 Tage	Die 22.07.25	Mon 28.07.25	31EA+1 Tag	33;25
33		Malerarbeiten		10 Tage	Die 29.07.25	Mon 11.08.25	32	28EA-5 T
34		Bodenbelagsarbeiten		8 Tage	Die 12.08.25	Don 21.08.25	33	36;27;37;
35		Sanitär Rohinstallation		5 Tage	Die 01.07.25	Mon 07.07.25	23	24
36		Sanitär Feininstallation		3 Tage	Fre 22.08.25	Die 26.08.25	34	
37		Schreinerarbeiten		4 Tage	Fre 22.08.25	Mit 27.08.25	34	42
38		Elektro/BMA Rohinstallation		5 Tage	Mit 02.07.25	Die 08.07.25	20	30EA-1 T
39		Elektro/BMA Feininstallation		3 Tage	Fre 22.08.25	Die 26.08.25	34	
40		Außenanlage		20 Tage	Die 08.07.25	Mon 04.08.25	29EA-10 Ta	
41		Abnahme/Mängelbeseitigung		5 Tage	Fre 22.08.25	Don 28.08.25	34	43
42		Abnahme BOA		2 Tage	Don 28.08.25	Fre 29.08.25	37	43
43		Übergabe an Nutzer		0 Tage	Fre 29.08.25	Fre 29.08.25	42;41	
44		Kita geschlossen		1 Tag	Fre 02.05.25	Fre 02.05.25		
45		Kita geschlossen		1 Tag	Die 10.06.25	Die 10.06.25		
46		Waldwoche		5 Tage	Mon 07.07.25	Fre 11.07.25		
47		Sommerschließung		15 Tage	Mon 14.07.25	Fre 01.08.25
