Nr.		Vorgangsn	VORGANG	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
41			0.01.902	Beschlussvorlage erarbeiten und abstimmen	3 Wochen	Di 15.05.18	Di 05.06.18	39EE
42			0.01.902	Termin für RB Beschluss	0 Tage	Di 27.02.18	Di 27.02.18	34EA+3 Tag
43			0.01.902	Termin für VSS-Beschluss	0 Tage	Di 27.03.18	Di 27.03.18	42EA+4 Woc
44			3.40.200	Freigabe zur Ausführung	0 Tage	Di 05.06.18	Di 05.06.18	43;39
45			5.05.060	Vertrag AP abgeschlossen	0 Tage	Di 27.02.18	Di 27.02.18	42
46			**0.01.902**	**Ausführungsplanung**	**140 Tage**	**Di 27.02.18**	**Di 11.09.18**	**45**
47				QG Planer 2 Leistungserbringung	0 Tage	Di 27.02.18	Di 27.02.18	45
48			0.01.902	Erarbeitung AP inkl. Fachplanungen	18 Wochen	Mi 28.02.18	Di 03.07.18	45
49			0.01.902	Erstellung Unterlagen zur Freigabe der Ausführungsplanung	10 Wochen	Mi 04.07.18	Di 11.09.18	48
50			0.01.902	Prüfphase EBA	12 Wochen	Mi 25.04.18	Di 17.07.18	46AA+40 Ta
51			5.10.060	Bauaufsichtliche Freigabe EBA liegt vor (Baurecht)	0 Tage	Di 17.07.18	Di 17.07.18	50
52			0.01.902	Erstellen LV	8 Wochen	Mi 04.07.18	Di 28.08.18	48
53			0.01.902	Prüfung LV	3 Wochen	Mi 29.08.18	Di 18.09.18	52
54			5.10.030	AP fachtechnisch geprüft (Letzte Planprüfung)	0 Tage	Di 18.09.18	Di 18.09.18	53
55			**0.01.902**	**Ausschreibung Bauleistungen**	**65 Tage**	**Mi 19.09.18**	**Di 18.12.18**	**54**
56			0.01.902	Unterschriftenlauf + Abstimmung Einkauf	3 Wochen	Mi 19.09.18	Di 09.10.18	
57			4.20.030	Veröffentlichung / Teilnahmeanträge.. (Bewerbungsfrist)	0 Tage	Di 09.10.18	Di 09.10.18	56
58			0.01.902	Bewerbungs- und Angebotsphase, offenes Verfahren EU	6 Wochen	Mi 10.10.18	Di 20.11.18	57
59			0.01.902	Auswertung / Bietergespräche	2 Wochen	Mi 21.11.18	Di 04.12.18	58
60			4.20.300	QG Vergabe Hauptaufträge	0 Tage	Mi 28.11.18	Mi 28.11.18	59EA-1 Woche
61			0.01.902	Unterschriftenlauf RB + Vortand	2 Wochen	Mi 05.12.18	Di 18.12.18	59
62			4.30.060	Vertrag (AP)/Bau/Ausrüstung abgeschlossen	0 Tage	Di 18.12.18	Di 18.12.18	61
63			0.01.902	Puffer	9 Wochen	Mi 19.12.18	Di 19.02.19	62
64			**0.01.902**	**Bauphase**	**529 Tage**	**Di 19.02.19**	**Mo 01.03.21**	
65				QG Bau AN 1 Leistungsbeginn	0 Tage	Di 19.02.19	Di 19.02.19	63
66			6.20.010	Baubeginn erfolgt (baubetriebl./ physisch)	0 Tage	Di 19.02.19	Di 19.02.19	63
67				Bauvorbereitung (Rodung, BE und sonst.)	8 Tage	Mi 20.02.19	Fr 01.03.19	66
68			0.21.060	Bauausführung	15 Monate	Mo 04.03.19	Fr 24.04.20	67
69				QG Planer 3 Leistungsende	0 Tage	Fr 24.04.20	Fr 24.04.20	68
70				QG Bau AN 2 Leistungserbringung	0 Tage	Fr 16.08.19	Fr 16.08.19	68AA+6 Monate
71			6.20.300	QG Abnahmebeginn	0 Tage	Fr 10.04.20	Fr 10.04.20	68EE-2 Woc
72			7.20.020	Abnahmeprüfung VOB / VOL erfolgt	0 Tage	Fr 08.05.20	Fr 08.05.20	71EA+4 Wochen
73				QG Bau AN 3 Leistungsende	0 Tage	Do 28.05.20	Do 28.05.20	72EA+14 Ta
74			7.30.070	Inbetriebnahme erfolgt	0 Tage	Fr 17.07.20	Fr 17.07.20	68EA+3 Mor
75			0.01.902	Schlussrechnung, Dolumentation usw.	8 Monate	Mo 20.07.20	Fr 26.02.21	74
76			7.40.300	QG Projektabschluss	0 Tage	Fr 26.02.21	Fr 26.02.21	75
77			7.40.070	Kaufmännischer Projektabschluss	1 Tag	Mo 01.03.21	Mo 01.03.21	76

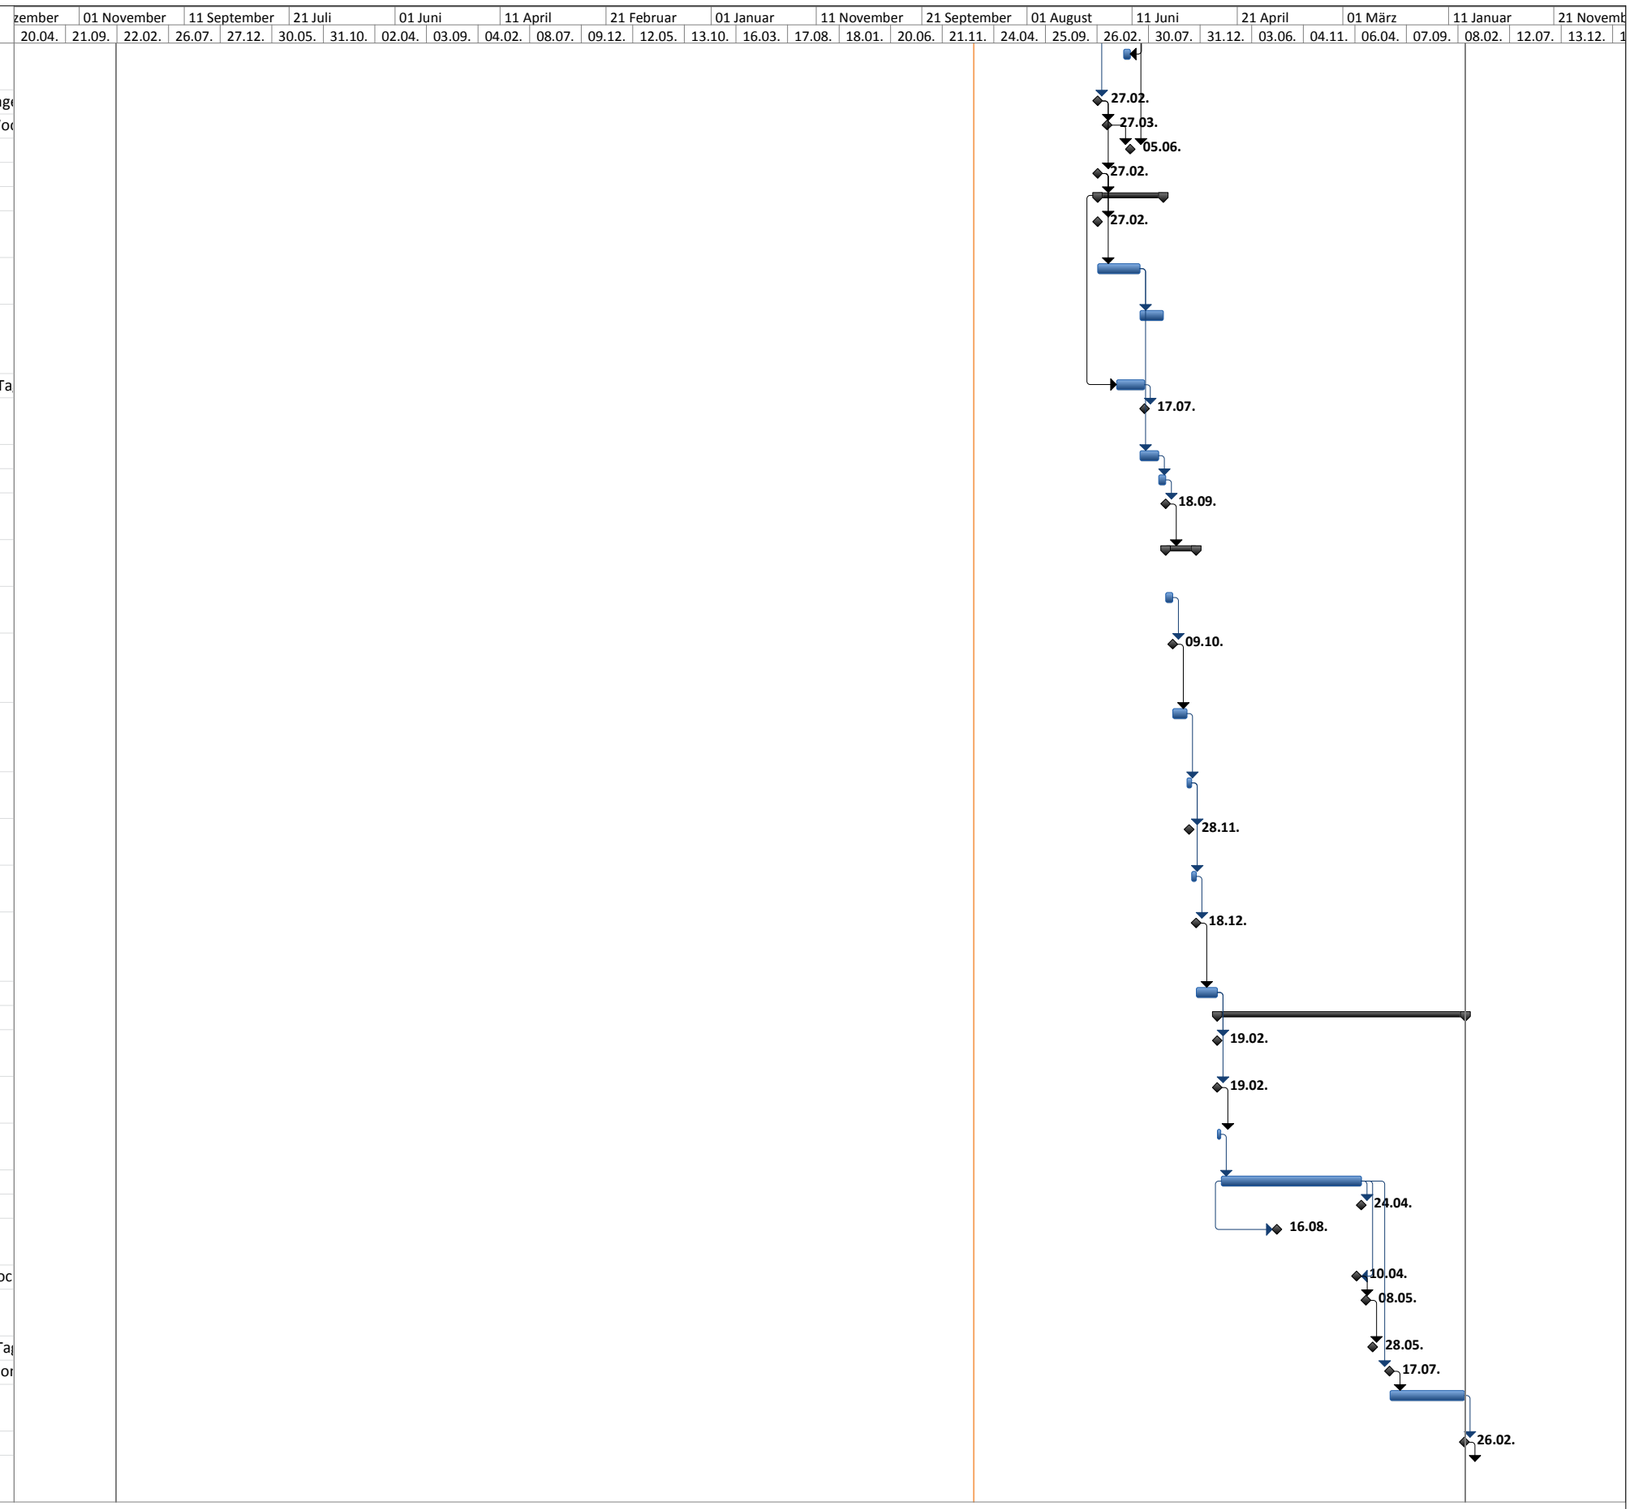

Projekt: GRANID_1
Datum: Do 23.02.17

Vorgang		Sammelvorgang		Externer Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende	
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	
Meilenstein		Externe Vorgänge		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		In Arbeit	

Anlage 1.3a
